



RETRAITEMENT DURABLE DES MATERIAUX DE CHANTIER

Lieu de prélèvement : Centrale AMR - FRESNES-SUR-MARNE

Granulats : Tout Venant Alluvionnaire

Péetrographie : Alluvionnaire

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

Norme NF P 11-300

Catégorie B4


	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	20	31.5	40	W	VBS
Etendue e																
V.S.S.+U																
V.S.S.	12.0				70.0								100.0			
V.S.I.	0.0				0.0								85.0			0.20
V.S.I.-U																

Partie informative

Résultats de production

du 07/12/22 au 07/12/22

	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	20	31.5	40	W	VBS
Moyenne Xt	11.6	25.1	44.4	52.1	59.5	65.8	68.2	71.0	73.9	77.4	81.9	89.8	98.5	100.0	10.6	0.44

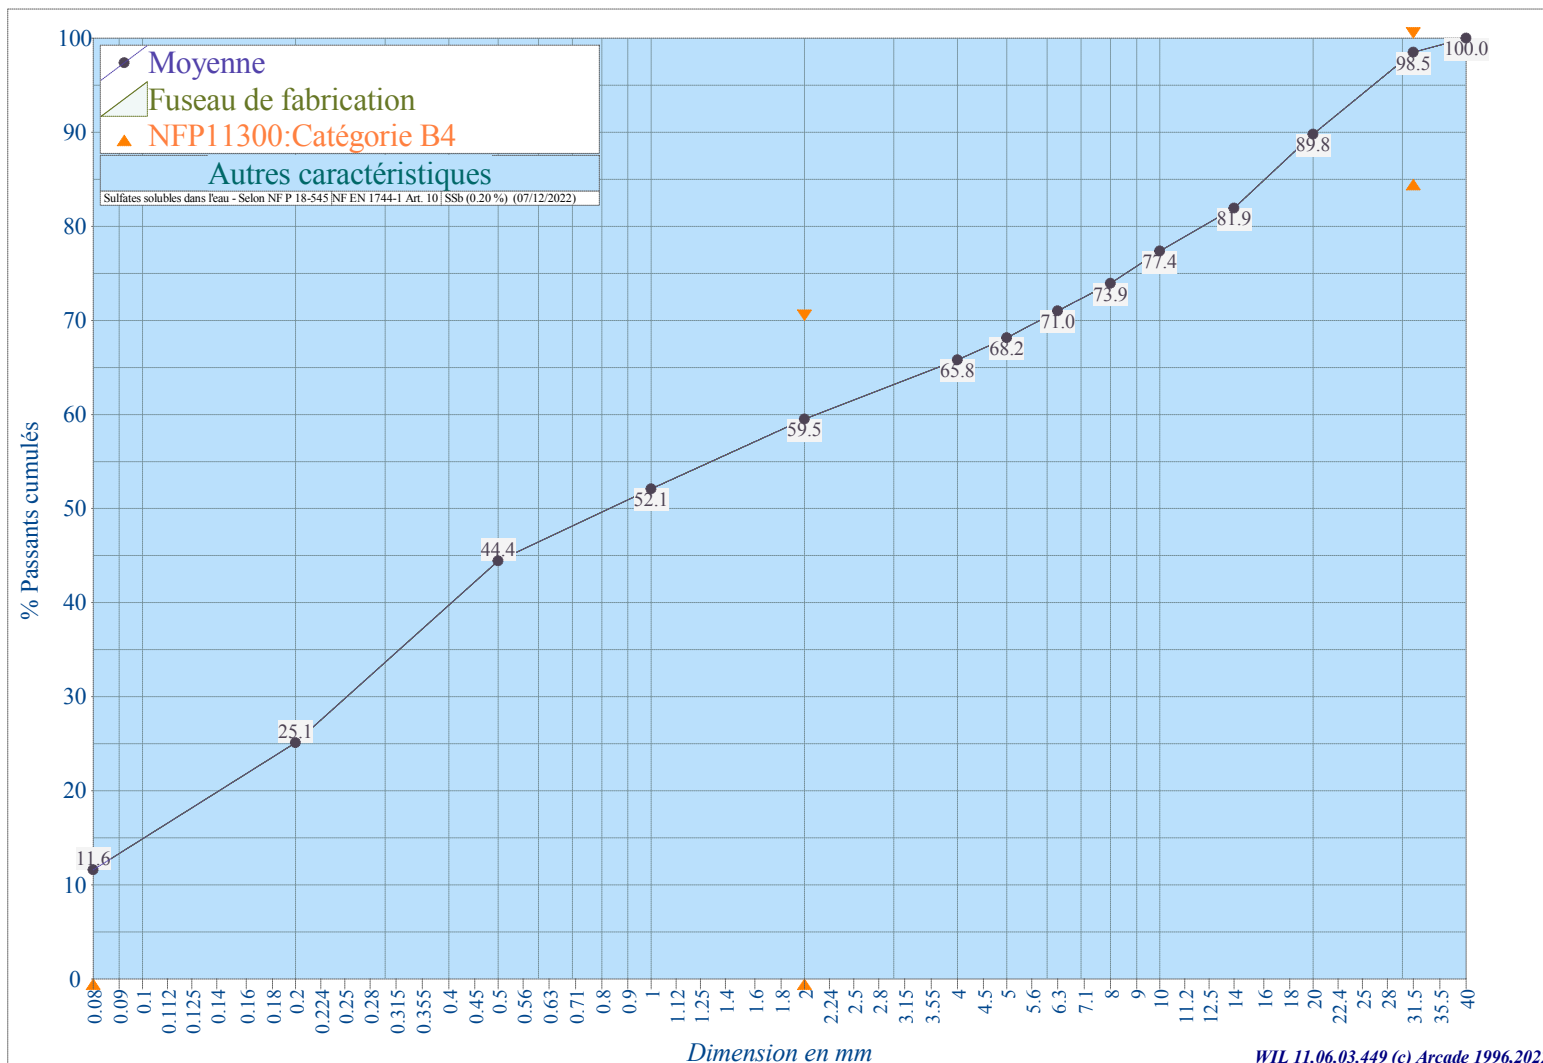

WIL 11.06.03.449 (c) Arcade 1996,2022

LABORATOIRE DE CONTROLE



Responsable laboratoire, HILAIRE E

